


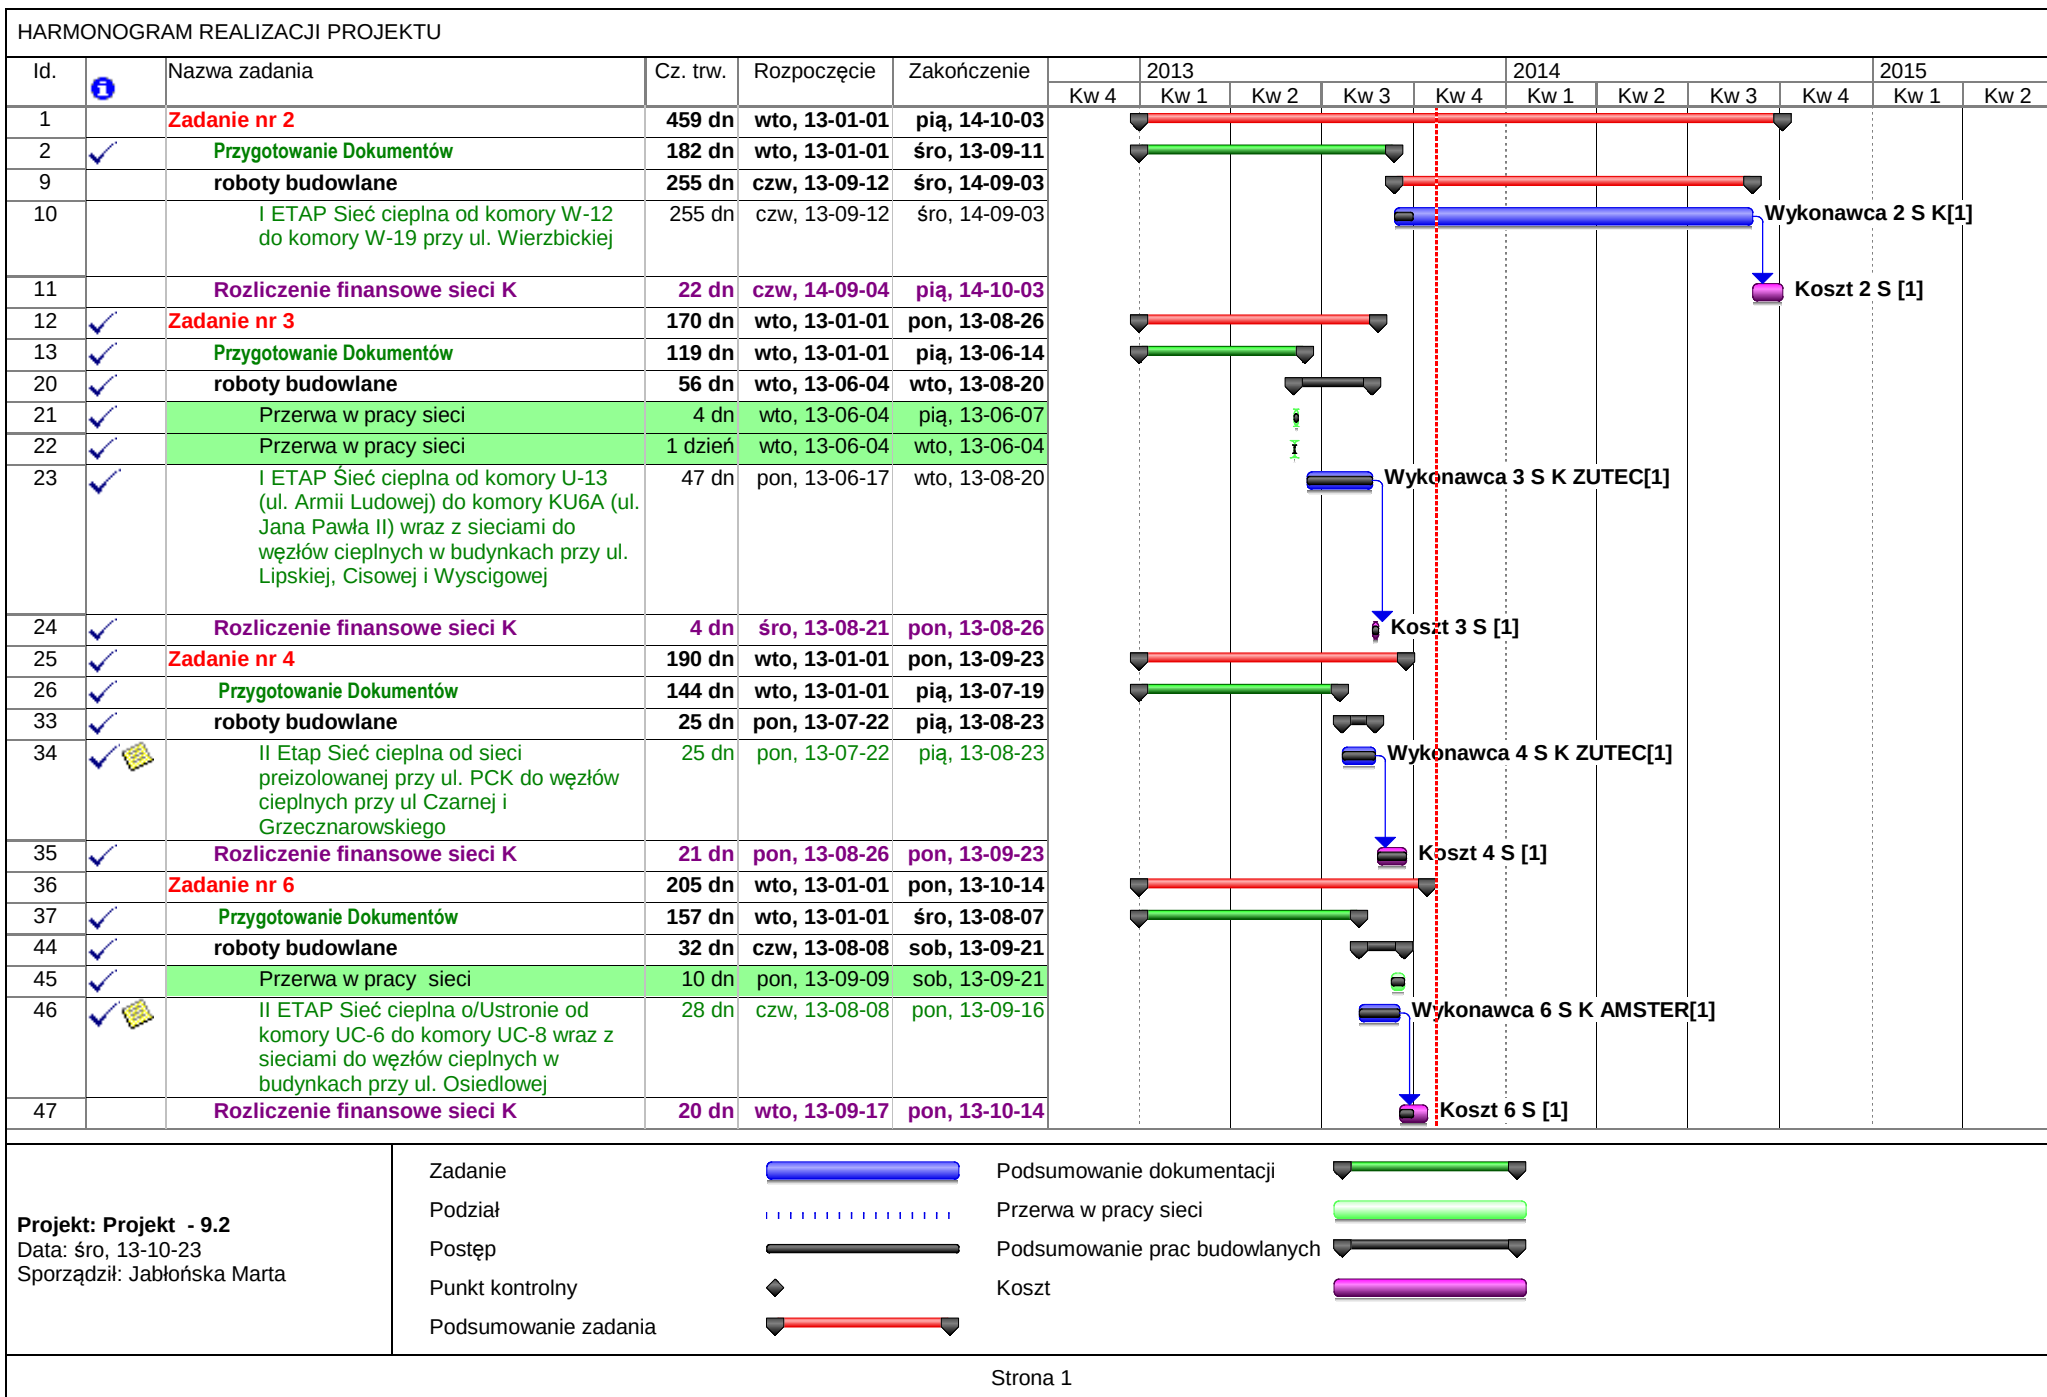

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Id.	Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	2013					2014				2015	
					Kw 4	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4	Kw 1	Kw 2
48	Zadanie nr 7	249 dn	wto, 13-01-01	pią, 13-12-13											
49	Przygotowanie Dokumentów	159 dn	wto, 13-01-01	pią, 13-08-09											
56	roboty budowlane	80 dn	pon, 13-07-29	pią, 13-11-15											
57	Przerwa w pracy sieci	5 dn	pon, 13-07-29	sob, 13-08-03											
58	Sieć ciepła przy ul. Grzybowskiej i Olsztyńskiej wraz sieciami do węzłów ciepłych w budynkach przy ul.	70 dn	pon, 13-08-12	pią, 13-11-15											
59	GRZYBOWSKA 10	70 dn	pon, 13-08-12	pią, 13-11-15											
60	GRZYBOWSKA 16/16a	70 dn	pon, 13-08-12	pią, 13-11-15											
61	GRZYBOWSKA 4/6	70 dn	pon, 13-08-12	pią, 13-11-15											
62	GRZYBOWSKA 7	70 dn	pon, 13-08-12	pią, 13-11-15											
63	GRZYBOWSKA 8	70 dn	pon, 13-08-12	pią, 13-11-15											
64	OLSZTYŃSKA 11	70 dn	pon, 13-08-12	pią, 13-11-15											
65	OLSZTYŃSKA 12	70 dn	pon, 13-08-12	pią, 13-11-15											
66	OLSZTYŃSKA 13	70 dn	pon, 13-08-12	pią, 13-11-15											
67	OLSZTYŃSKA 9	70 dn	pon, 13-08-12	pią, 13-11-15											
68	Rozliczenie finansowe sieci K	20 dn	pon, 13-11-18	pią, 13-12-13											
69	Rozliczenie finansowe węzły K	20 dn	pon, 13-11-18	pią, 13-12-13											
70	Zadanie nr 8	249 dn	wto, 13-01-01	pią, 13-12-13											
71	Przygotowanie Dokumentów	198 dn	wto, 13-01-01	czw, 13-10-03											
78	roboty budowlane	31 dn	pią, 13-10-04	pią, 13-11-15											
79	Przerwa w pracy sieci	2 dn	czw, 13-10-10	pią, 13-10-11											
80	I Etap Sieć ciepła od komory M5A (ul. Mieszka I) o/Michałów wraz z sieciami do węzłów w budynkach przy ul. Sobieskiego, Królewskiej, Jadwigi oraz Jagiellońskiej	31 dn	pią, 13-10-04	pią, 13-11-15											
81	Rozliczenie finansowe sieci K	20 dn	pon, 13-11-18	pią, 13-12-13											
82	Zadanie nr 10	215 dn	wto, 13-01-01	pon, 13-10-28											
83	Przygotowanie Dokumentów	153 dn	wto, 13-01-01	czw, 13-08-01											
90	roboty budowlane	42 dn	pią, 13-08-02	pon, 13-09-30											
91	Przerwa w pracy sieci	5 dn	pon, 13-08-19	pią, 13-08-23											

Projekt: Projekt - 9.2

Data: śro, 13-10-23

Sporządził: Jabłońska Marta

Zadanie

Podział

Postęp

Punkt kontrolny

Podsumowanie zadania




Podsumowanie dokumentacji

Przerwa w pracy sieci

Podsumowanie prac budowlanych

Koszt



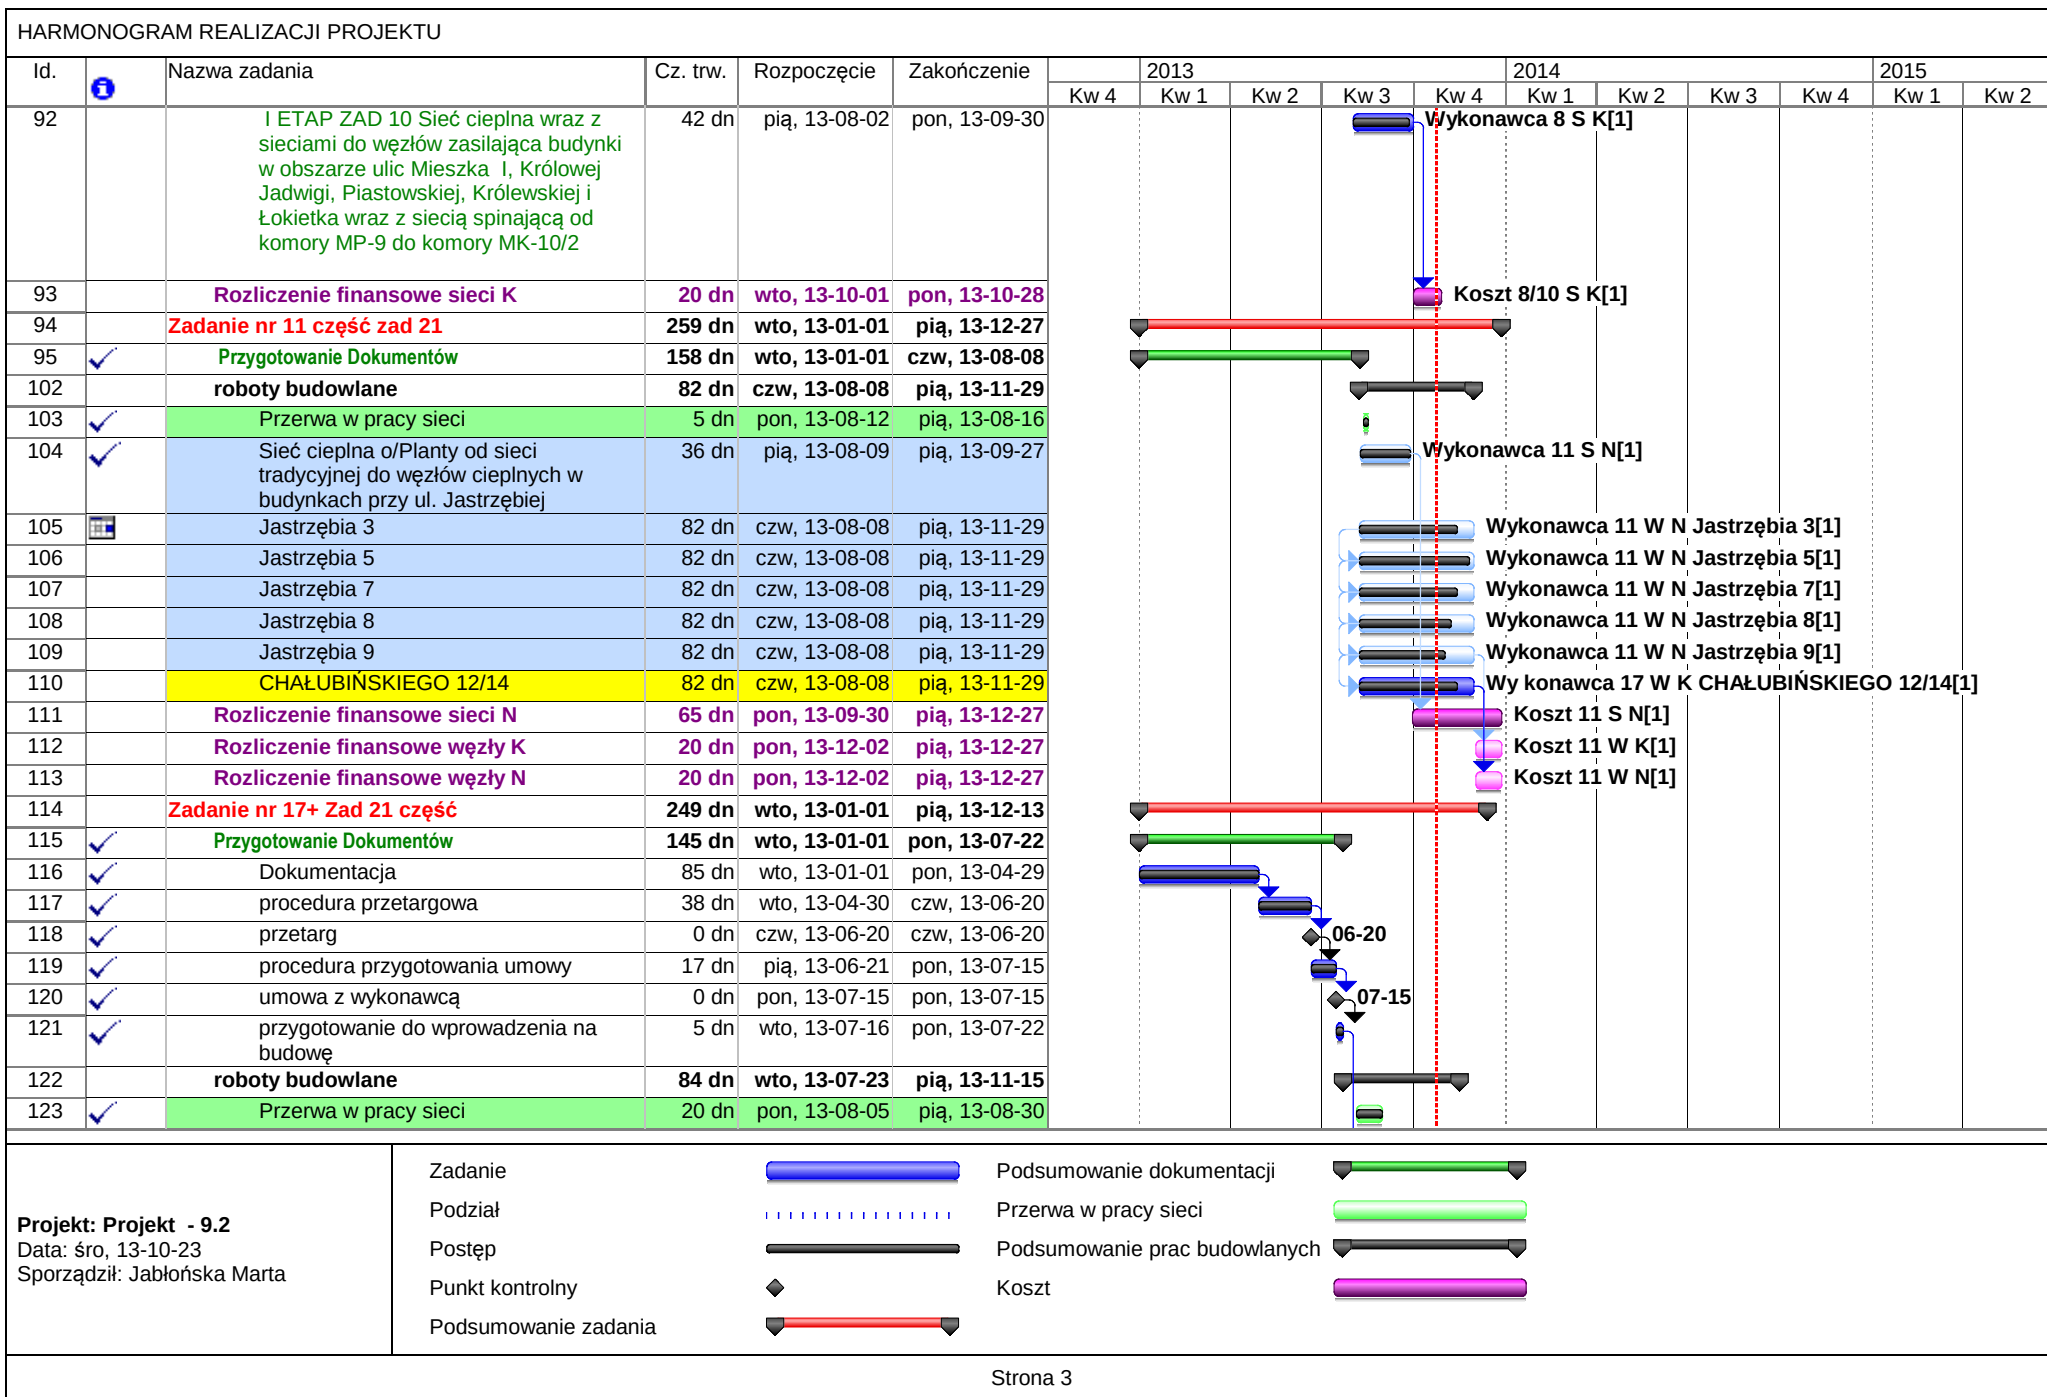

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Id.		Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	2013					2014				2015	
						Kw 4	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4	Kw 1	Kw 2
124	✓	Sieć ciepła o/Golebiów - Łucznik od komory M-7 (ul. Żółkiewskiego) wraz z sieciami do węzłów ciepłych w budynkach przy ul. Paderewskiego, Szczawińskiego i Chrobrego	43 dn	wto, 13-07-23	czw, 13-09-19											
125		ZAD 21 SZCZAWINSKIEGO 6	75 dn	pon, 13-08-05	pią, 13-11-15											
126		ZAD 21 CHROBREGO 46	75 dn	pon, 13-08-05	pią, 13-11-15											
127		ZAD 21 DASZYNSKIEGO 3	75 dn	pon, 13-08-05	pią, 13-11-15											
128		ZAD 21 DASZYNSKIEGO 8	75 dn	pon, 13-08-05	pią, 13-11-15											
129		ZAD 21 PADEREWSKIEGO 28	75 dn	pon, 13-08-05	pią, 13-11-15											
130		Rozliczenie finansowe sieci K	20 dn	pią, 13-09-20	czw, 13-10-17											
131		Rozliczenie finansowe węzły K	20 dn	pon, 13-11-18	pią, 13-12-13											
132	✓	Zadanie nr 18	163 dn	wto, 13-01-01	czw, 13-08-15											
140		Zadanie nr 21	259 dn	wto, 13-01-01	pią, 13-12-27											
141	✓	Przygotowanie Dokumentów	160 dn	wto, 13-01-01	pon, 13-08-12											
148		roboty budowlane	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
149	✓	Przerwa w pracy sieci	6 dn	pon, 13-09-23	pon, 13-09-30											
150		Marii Gail 22/24 A	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
151		Marii Gail 22/24 B	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
152		CZARNOLESKA 10	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
153		CZARNOLESKA 15	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
154		POLICKA 4	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
155		SANDOMIERSKA 19	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
156		FILTROWA 11	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
157		GAGARINA 19	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
158		GĘBARZEWSKA 37A	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
159		POLICKA 2	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
160		OSIEDŁOWA 26	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
161		SZKLANA 20	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
162		ZEROMSKIEGO 83	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
163		OLSZTYNSKA 35	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
164		PADEREWSKIEGO 4	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
165		PADEREWSKIEGO 8	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											
166		PCK 13	69 dn	wto, 13-08-13	pią, 13-11-15											

Projekt: Projekt - 9.2 Data: śro, 13-10-23 Sporządził: Jabłońska Marta	Zadanie		Podsumowanie dokumentacji	
	Podział		Przerwa w pracy sieci	
	Postęp		Podsumowanie prac budowlanych	
	Punkt kontrolny		Koszt	
	Podsumowanie zadania			

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU																
Id.		Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie		2013				2014				2015	
						Kw 4	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4	Kw 1	Kw 2
167		Protokół odbioru	10 dn	pon, 13-11-18	pią, 13-11-29											
168		Rozliczenie finansowe węzły K	20 dn	pon, 13-12-02	pią, 13-12-27						Koszt 21 W K[1]					
Projekt: Projekt - 9.2 Data: śro, 13-10-23 Sporządził: Jabłońska Marta		Zadanie		Podsumowanie dokumentacji												
		Podział		Przerwa w pracy sieci												
		Postęp		Podsumowanie prac budowlanych												
		Punkt kontrolny		Koszt												
		Podsumowanie zadania														
Strona 5																
